新竹縣政府環境保護局 110年度執行氣候低碳永續家園建構 推動計畫

校園改善措施作業完工報告書

主辦單位:新竹縣政府環境保護局

委辦單位:方達科技股份有限公司


改造學校:新竹縣新豐鄉福興國民小學


中華民國 110 年 9 月 27 日


1.申請單位基本資料

申請單位	新竹縣新豐鄉福興國民小學		
單位地址	新竹縣新豐鄉後湖村後湖子 108 號		
聯絡人	總務主任: 黃琬筠 聯絡電話 03-5680964#12		03-5680964#12
施工期程	110/9/17 \ 110/9/22~25		


2. 施工平面配置圖

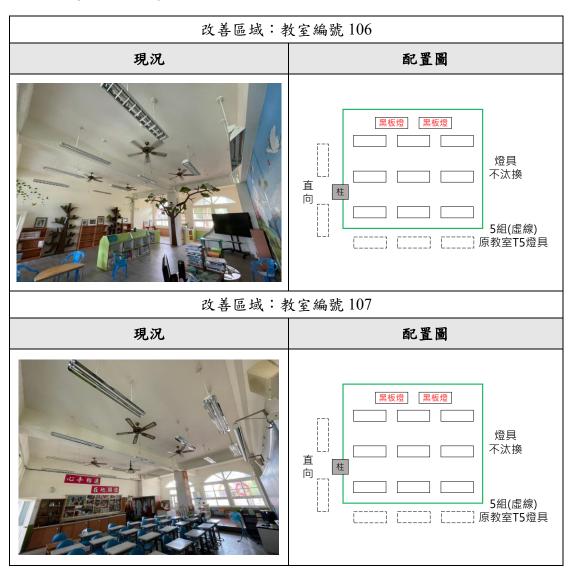

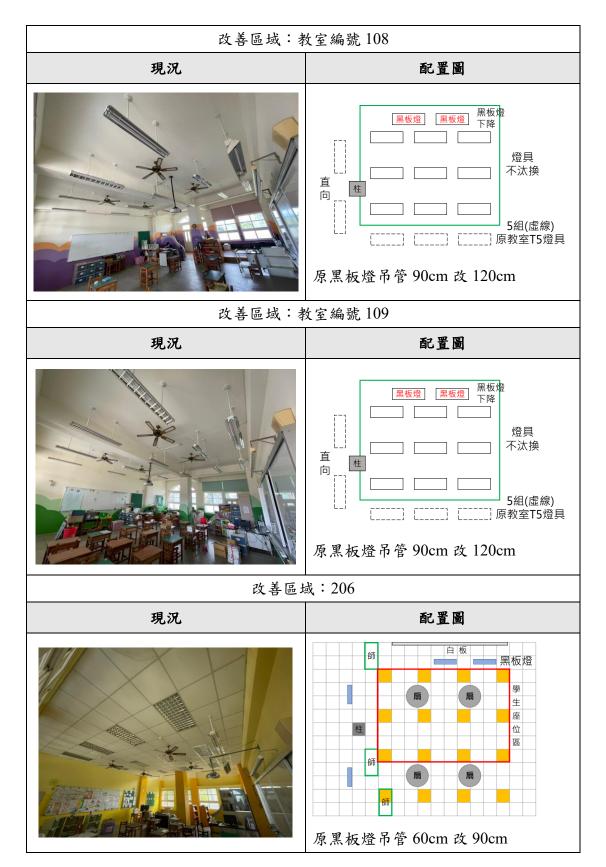

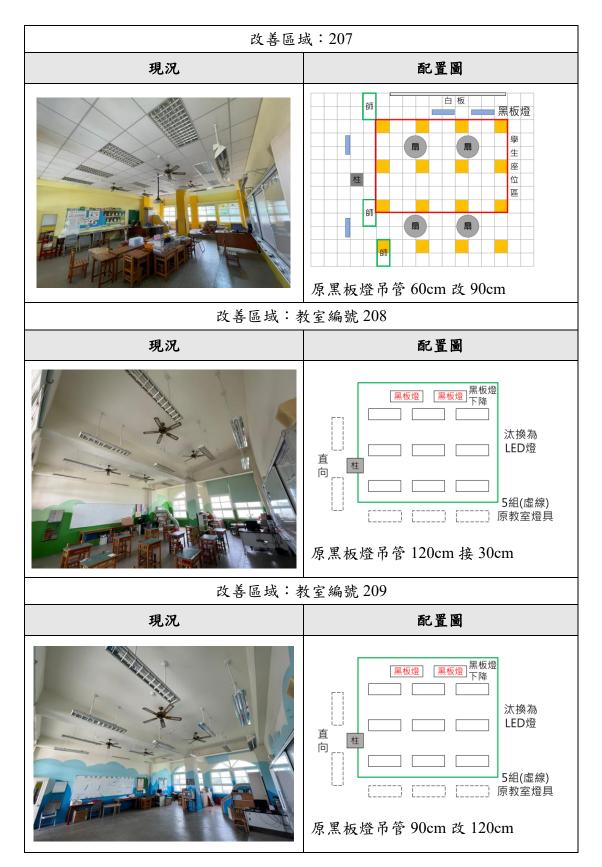

改善區域:214			
現況	配置圖		
	原黑板燈吊管 60cm 改 90cm		
改善區均	或:215		
現況	配置圖		
	/		
改善區域:孝	· 效室編號 217		
現況	配置圖		
	沙 發 區會 議桌辨 公 桌		

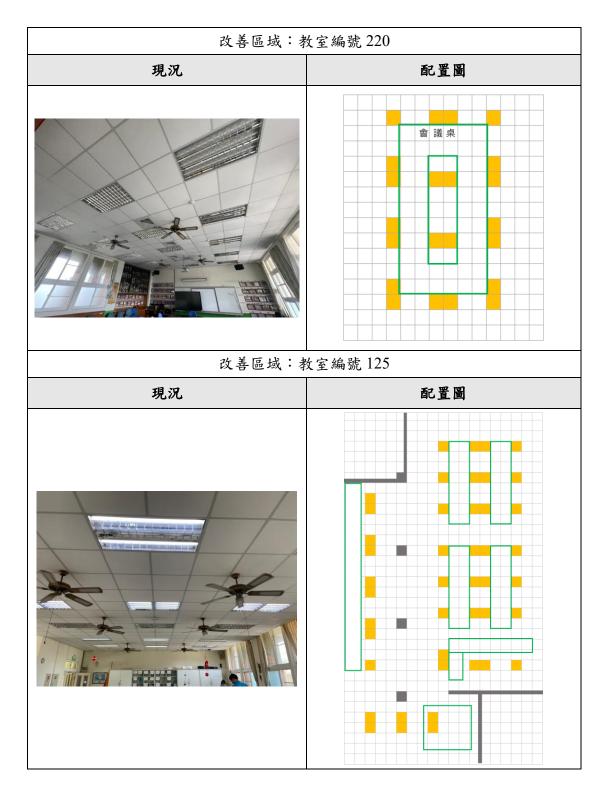

改善區域:教室編號 314			
現況	配置圖		
	直向 直向 直向減盞		
改善區域:	收室編號 201 		
現況	配置圖		
	LED 燈泡依原位置安裝		

改善區域:教室編號305 現況 配置圖 LED 燈泡依原位置安裝 改善區域:教室編號306 現況 配置圖 LED 燈泡依原位置安裝 改善區域:教室編號311 現況 配置圖 LED 燈泡依原位置安裝

3. 實際汰換數量

位置	設備項目	數量
208	黑板燈:LED4尺2管	2
208	座位區:LED工字型4尺2管	9
209	黑板燈:LED4尺2管	2
209	座位區:LED工字型4尺2管	9
	黑板燈:LED4尺2管	2
206	座位區:LED 輕鋼架 2 尺 4 管	16
	閱讀區、清潔區:LED 吸頂燈 4 尺 2 管	2
	黑板燈:LED4尺2管	2
207	座位區:LED 輕鋼架 2 尺 4 管	16
	閱讀區、清潔區:LED 吸頂燈 4 尺 2 管	2
214	黑板燈:LED4尺2管	2
214	座位區:LED 輕鋼架 2 尺 4 管	16
217	LED 輕鋼架2尺4管	22
220	LED 輕鋼架2尺4管	22
125	LED 輕鋼架2尺4管	44
214	LED 燈泡	9
314	LED 山形燈 4 尺 2 管	5
311	LED 燈泡	9
	LED 山形燈 4 尺 2 管	5
305	LED 燈泡	8
306	LED 燈泡	8
201	LED 燈泡	16

- 1. 辦公室 125: 原有 1 組 LED 山形燈 4 尺 2 管, 經現場評估後照度足夠,故 將此展移至電腦教室 311
- 2. 電腦教室 311: LED 燈泡數量計算有誤應為 9 盞 , 及增加 1 盞 LED 山形燈 4 尺 2 管

4.改善前/後 設備耗能基線量測數據

改善前					
1.改善前設備用	1.改善前設備用電量				
設備	規格	設備電功率	數量	使用時數	年用電量
型式	規格	功率值(W)	組	hr/年	kWh/年
Т8	4尺	40	378	1,600	21,376
T5	4尺	28	106	1,600	1,344
水銀燈泡	-	200	49	800	7,840
加總				30,560	
	改善後				
1.改善後設備用	1電量				
設備	規格	設備電功率	數量	使用時數	年用電量
型式	規格	功率值(W)	組	hr/年	kWh/年
LED	4尺	13	84	1,600	3,744
LED	2尺	6.5	544	1,600	5,658
LED	燈泡	90	49	800	3,528
加總				12,930	

實際節能量及節能率說明:

● 年節電量:30,560-12,930=17,630(度)

● 年節碳量: 17,630 (度)×0.492 kg CO₂e (每度電排碳量)= 8,674.16 kg CO₂e

● 年節省費用:17,630(度) ×4(每度/元)=70,522 元

● 預計改善經費:355,373 元

● 預計回收年限: 355,373 (改善經費)÷54,301.63 (年節省費用)= 6.54(年)

註:

1.電費價格:3.08 元/度(引用服務業節能服務網-單位用電度數平均電價中 107 年度學校平均電價)

2.民國 109 年排碳係數:每1度電排放 0.492kg CO₂e;每1度水排放 0.0580kg CO₂e

5. 施工中及完工照片







改善項目	吊車進場進行吊掛作業
拍攝日期	110/9/25

改善項目 更換 90W 之 LED 燈 拍攝日期 110/9/25





改善項目	自走車進行安裝作業
拍攝日期	110/9/25

改善項目自走車進行安裝作業拍攝日期110/9/25





改善項目	綜合教室 LED 更換完畢	改善項目	吊車進場吊掛作業結束
拍攝日期	110/9/25	拍攝日期	110/9/25

6. 驗收單位確認

驗收時間	110/9/27		
驗收結果	汰換教室位置正確、燈具型號及數量正確、使用狀況良好		
施工廠商		驗收人員	
),	廠商用印	驗收人員用印	
